

# Report di GanttProject

Progetto : Pontasserchio Via De Gasperi 81

Inizio : 04/09/17

Fine : 26/01/18

Organizzazione : APES

Link Web : <http://>

Descrizione :

Lavori di Manutenzione Straordinaria Condominiali

Pisa, 20 marzo 2016

Arc. Stefano Giovannoni

A circular blue ink stamp is located in the bottom right corner. The text around the perimeter of the stamp reads "ARCA STEFANO GIOVANNONI" at the top and "PISA" at the bottom. In the center of the stamp, the text "S.C.P.A." is visible. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink that appears to read "Stefano Giovannoni".

## Lista attività


Nome	Risorse	
	Data d'inizio	Data di fine
Installazione Cantiere	04/09/17	06/09/17
Ponteggio	07/09/17	15/09/17
allargamento botola	11/09/17	18/09/17
Rimozione Amianto	18/09/17	21/09/17
demolizione abbaino	22/09/17	22/09/17
Smontaggio Tetto	22/09/17	25/09/17
abbaino ricostruzione	26/09/17	27/09/17
stesura I guaina	28/09/17	02/10/17
Coibentazione	03/10/17	05/10/17
stesura II guaina	06/10/17	10/10/17
lattonerie e finiture	11/10/17	12/10/17
posa manto	11/10/17	17/10/17
lattoneria e finiture	18/10/17	18/10/17
spicconatura intonaci	19/10/17	27/10/17
spicconatura cemento	19/10/17	27/10/17
sostituzione e recupero infissi	30/10/17	06/11/17
ripristino intonaci	07/11/17	20/11/17
recupero cemento	07/11/17	20/11/17
tinteggiatura interni esterni	21/11/17	04/12/17
smontaggio ponteggio	05/12/17	12/12/17
Demolizione marciapiedi e fossa settica	13/12/17	21/12/17
marciapiedi ricostruzione	22/12/17	11/01/18
nuova fognatura	12/01/18	22/01/18
cantiere smontaggio	23/01/18	25/01/18

## Lista risorse

Nome

Ruolo predefinito

# Diagramma di Gantt

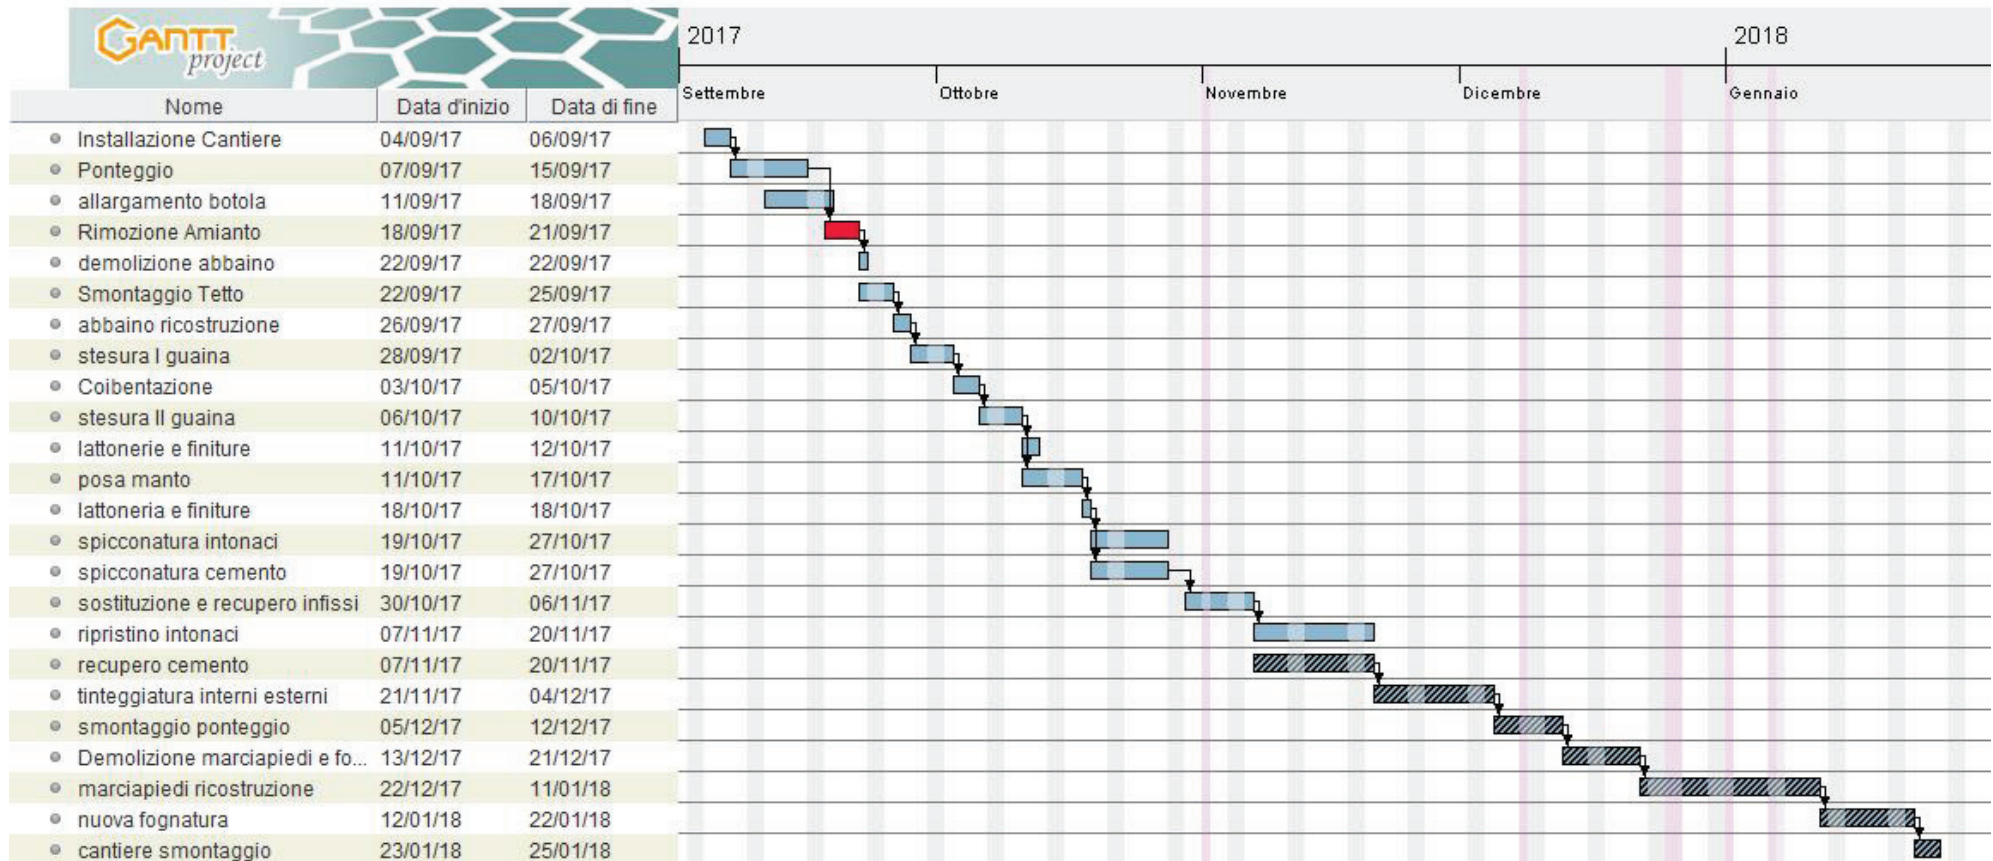

# Diagramma Risorse

