## Diagramma di GANNT

**_Cronoprogramma dei lavori_**

| | |
|---|---|
| Nome o codice interno della commessa o del contratto: | H54J16000000002 |
| Descrizione del lavoro e indirizzo di intervento: | **DEMOLIZIONE TRE FABBRICATI - VIA VERITÀ, VIA SIRTORI** |
| Data prevista inizio lavori: | **10/2021** |

| | Attività (in ordine cronologico) | Inizio Lavori | Fine Lavori | Durata (gg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allestimento del cantiere | 01/10/2021 | 03/10/2021 | 3 |
| 2 | Rimozione mobilia | 04/10/2021 | 13/10/2021 | 10 |
| 3 | Bonifica amianto (fabbricati 1/2/3) | 14/10/2021 | 31/10/2021 | 18 |
| 4 | Smontaggio e separazione infissi in legno e vetro (3 fabbr.) | 01/11/2021 | 15/11/2021 | 15 |
| 5 | Smontaggio pluviali, gronde, comignoli, antenne, ecc. (fabbr. 1) | 16/11/2021 | 19/11/2021 | 4 |
| 6 | Smontaggio pluviali, gronde, comignoli, antenne, ecc. (fabbr. 2) | 20/11/2021 | 23/11/2021 | 4 |
| 7 | Smontaggio pluviali, gronde, comignoli, antenne, ecc. (fabbr. 3) | 24/11/2021 | 27/11/2021 | 4 |
| 8 | Demolizione primaria (fabbricato 1) | 28/11/2021 | 02/12/2021 | 5 |
| 9 | Demolizione primaria (fabbricato 2) | 03/12/2021 | 07/12/2021 | 5 |
| 10 | Demolizione primaria (fabbricato 3) | 08/12/2021 | 12/12/2021 | 5 |
| 11 | Demolizione secondaria (fabbricato 1) | 13/12/2021 | 17/12/2021 | 5 |
| 12 | Demolizione secondaria (fabbricato 2) | 18/12/2021 | 22/12/2021 | 5 |
| 13 | Demolizione secondaria (fabbricato 3) | 23/12/2021 | 27/12/2021 | 5 |
| 14 | Smobilizzo del cantiere | 28/12/2021 | 30/12/2021 | 3 |

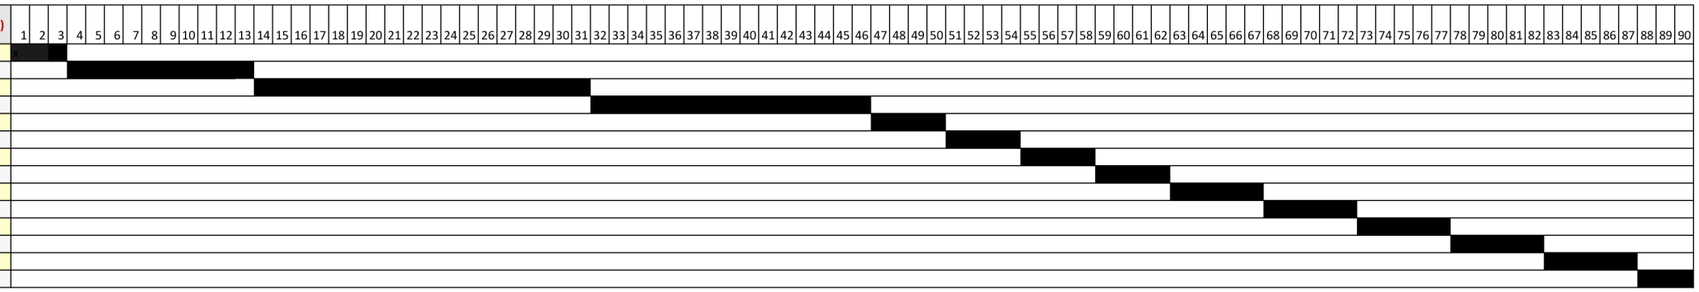

| | | |
|---|---|---|
| Data prevista fine lavori: | **12/2021** | |
| | 90 | Giorni previsti |

| | |
|---|---|
| Data di fine elaborazione del cronoprogramma: | **07/2021** |

Per Demolizione primaria si intende:

- Demolizione con mezzi meccanici
- Separazione a terra di cemento armato

Per Demolizione secondaria:

- Caratterizzazione
- Stoccaggio e trasporto

**LAVORI DI DEMOLIZIONE DI N° 3 FABBRICATI SITI IN PISA, LOCALITÀ**

S.ERMETE, VIA VERITÀ 7/8, VIA SIRTORI 9/10 E 11/12

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

(Ing. Annamaria Fulciniti)

COLLABORATORE AL PROGETTO

(Dott.ssa Paola Iacovone)

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. Chiara Cristiani)

# PSC_ALLEGATO “A”: DIAGRAMMA DI GANTT
